

**SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física**  
**Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas**  
**Dirección de Infraestructura Deportiva**

**PROYECTO: K002 MD-** Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura

Líder del Proyecto:	Torres Santander, Marcos Eduardo (mtorres@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Programas Relacionados:	CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, Provincia - Imbabura
Titular:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	914800006515071	TIR:	56.10 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,612,599.33
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,473,203.78
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2008 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	12/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/07/2013
Modificado por:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2019


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p>OBJETIVO GENERAL: Finalizar de manera integral el Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura, incluyendo la ejecución o mejoramiento de obras que permitan tener una infraestructura sistémica para la formación, desarrollo y preparación de los deportistas y la juventud del sector; con el fin de entregar a la población, de manera organizada, instalaciones de calidad y brindar un mayor acceso a la práctica de actividades deportivas.</p> <p>ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratar un estudio completo del Plan Integral de Construcción para obtener la base sobre la cual se deberá ejecutar los trabajos de terminación del Centro de Deportes colectivos.</li> <li>- Entrega de proyecto integral complementario y transferencia de recursos al Instituto de Contratación de Obras para la ejecución de los trabajos.</li> <li>- Mantener un permanente control del avance de las obras y brindar todo el apoyo y asesoramiento requerido.</li> <li>- Exigir a Contratante y Contratista, el cumplimiento estricto del control de calidad, seguridad industrial, leyes, reglamentos y normas pertinentes.</li> </ul>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejorar la autoestima de la población infanto-juvenil.</li> <li>- Construir un espacio recreativo que permita la masificación del deporte.</li> <li>- Capacitar de manera integral a los jóvenes para impulsar la práctica competitiva del deporte.</li> </ul>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Deportistas, personas que realizan actividad física y población que acude como espectadora a los escenarios deportivos.
<b>Restricciones</b>
<p>TIEMPO: 13 años</p> <p>COSTO: USD 21.445.582,18 2008-2021</p> <p>ALCANCE: Construcción de un Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura, con beneficiarios directos: 41.360 usuarios e indirectos: 300.000,00 personas</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 86.74 %  
 Fecha de Inicio: 01/03/2008 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

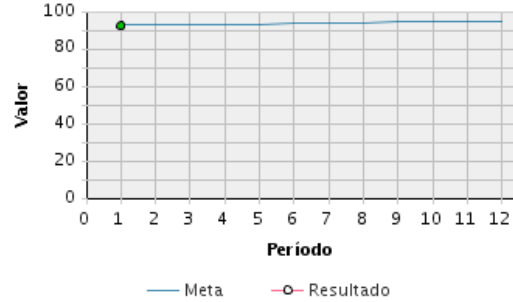

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %
	Avance real acumulado											
	92 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2020:</p> <p>En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos debido a la falta de personal ya que los profesionales liquidadores trabajaron hasta el 31 de diciembre de 2019. (Ver anexo H-07)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:03 PM
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del año 2019, (Ver anexo H-06)</li> <li>- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación para continuar con los procesos de cierre de los contratos que tiene abiertos a cargo de la Secretaría del Deporte, (Ver anexo H-06)</li> </ul>	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 01:58 PM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre del año 2019 (Ver anexo H-05).</li> <li>- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación para continuar con los procesos de cierre de los contratos que tiene abiertos a cargo de la Secretaría del Deporte, (Ver anexo H-05)</li> </ul>	Torres Santander, Marcos Eduardo	03/01/2020 - 10:56 AM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2019 (Ver anexo H-04).</li> <li>- La dirección financiera informa sobre el pago a la aseguradora del contrato Nro. 102-DJ-2008, por un monto de \$ 15.743,09 Dólares (Ver anexo H-04).</li> <li>- Solicitud y aprobación de la reprogramación para el pago al contratista el proceso Nro. 102-DJ-2008, monto de \$ 9.708,76 Dólares (Ver anexo H-04).</li> </ul>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/12/2019 - 01:48 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del año 2019 (Ver anexo H-02).</li> <li>- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación para continuar con los procesos de cierre de los contratos que tiene abiertos a cargo de la Secretaría del Deporte, (Ver anexo H-02)</li> <li>- Se reporta la justificación y continuidad del Riesgo Septiembre 2019 (Ver anexo H-03)</li> </ul>	Torres Santander, Marcos Eduardo	06/11/2019 - 05:37 PM
<p>AGOSTO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2019 (Ver anexo H-01).</li> </ul>	Torres Santander, Marcos Eduardo	07/10/2019 - 01:20 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se realiza el pago de la Aseguradora para la devolución de póliza de fiel cumplimiento del contrato Nro. 102-DJ-2008 (Ver anexo H-01).		
<p><b>JUNIO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2019.</li> <li>-Mediante oficio Nro. SECOB-CZ1-2019-0223-O, el SECOB solicita se realice una reunión con el objetivo de tratar la entrega del CEAR Carpuela como bien Público a la Secretaría del Deporte.</li> <li>-Mediante oficio Nro. SD-CAID-2019-0140, la Secretaría del Deporte confirma la asistencia a la reunión solicitada. (Ver Anexo (G-08)</li> </ul>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/08/2019 - 12:10 PM
<p><b>MAYO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes de Mayo del año 2019, no se han realizado gestiones para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría. Ver anexo G-07</li> </ul>	Torres Santander, Marcos Eduardo	02/07/2019 - 08:37 AM
<p><b>MARZO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de abril del año 2019. Ver anexo G-06.</li> <li>- Reforma y Reprogramación del pago para el contrato 102-DJ-2008 Ver anexo G-06.</li> </ul>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	06/05/2019 - 05:29 PM
<p><b>MARZO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de marzo del año 2019. Ver anexo G-05.</li> </ul>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	05/04/2019 - 05:43 PM
<p><b>ENERO - FEBRERO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en los meses de enero-febrero del año 2019. Ver anexo G-04.</li> </ul>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/03/2019 - 11:36 AM
<p><b>DICIEMBRE 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del año 2018. Ver anexo G-02</li> <li>- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, Ver anexo G-03</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	04/01/2019 - 05:23 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre del año 2018. Ver anexo F-08</li> <li>- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, Ver anexo F-09</li> <li>- Destalle justificativos Pagos, Ver anexo G-01</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:02 AM
<p><b>OCTUBRE 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2018. Ver anexo F-05</li> <li>- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-06</li> <li>- Se realiza la Reprogramación al POA Proyecto K002 MD Carpuela de, Ver anexo F-07</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:02 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del año 2018. Ver anexo F-03</li> <li>- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-04</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:01 AM
<p><b>AGOSTO 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2018. Ver anexo F-01</li> <li>- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-02</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:01 AM
<p><b>JULIO 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2018. Ver anexo E-09</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:01 AM
<p><b>JUNIO 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2018. Ver anexo E-06</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:00 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (E-07)</li> <li>- Se aprueba la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) solicitada por la Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (E-08)</li> </ul>		
<p>MAYO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reporta como liquidado un (1) contrato de obra (061-DJ-2008) en el mes de Mayo del año 2018. Ver anexo E-01</li> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año 2018. Ver anexo E-02</li> <li>- El contrato (062-DJ-2008) se encuentra en proceso de pago por un valor de \$ 15.204,29 dólares, financiero solicita se informe la razón del cambio en la modalidad de pago Ver anexo (E-03)</li> <li>- El contrato (109-DJ-2008) programado para pago en el mes de mayo por un valor de \$ 717,44 dólares, la dirección de Planificación rechaza la solicitud de Certificación POA, Ver anexo (E-04)</li> <li>- Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de Infraestructura Deportiva (Ver anexo E-05)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 09:59 AM
<p>Abril 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Abril del año 2018. Ver anexo D9</li> </ul> <p>Marzo 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0141, de fecha 02/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva solicita a la Dirección de Planificación e Inversión la reprogramación de los pesos de asignación a los hitos programados en la erramienta GPR. (Ver anexo D7)</li> <li>- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0190 de fecha 08/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva, remite la reforma al Plan Operativo Anual 2018. (Ver anexo D7)</li> <li>- Con memorando Nro. MD-DPI-2018-0530 de fecha 19/03/2018, la Dirección de planificación e Inversión Informa la validación de Reformas y Reprogramaciones a los Proyectos de Inversión de la DID. (Ver anexo D7)</li> </ul> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Marzo del año 2018. Ver anexo D8</p> <p>FEBRERO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de febrero del año 2018. Ver anexo D6</li> </ul> <p>ENERO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de ENERO 2018. Ver anexo D6</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	04/05/2018 - 05:28 PM
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de DICIEMBRE 2017. Ver anexo D4</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/01/2018 - 10:03 AM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre 2017. Ver anexo D2</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/12/2017 - 02:57 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017. Ver anexo D2</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	01/11/2017 - 04:23 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre de 2017. Ver anexo D1</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/10/2017 - 10:39 AM
<p>AGOSTO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reportó como liquidado 1 contrato de obra (101-DJ-2008) en el mes de Agosto 2017. Ver anexo C8</li> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto 2017. Ver anexo C9</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/09/2017 - 12:11 PM
<p>JULIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reportó como liquidado 1 contrato de obra en el mes de julio 2017. Ver anexo C6</li> <li>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de julio 2017. Ver anexo C7</li> </ul>		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reporta a la Dirección de Seguimiento, Planes y Programas como liquidado un contrato de obra. Ver anexo C5.</li> <li>- En el mes de mayo con fecha 18-05-2017, se registró el pago del contrato No. 076-DJ-2008, cuyo objeto fue: "Construcción del restaurante en el centro de formación de deportes colectivos en la localidad de Carpuela ubicado entre las provincias de Carchi e Imbabura", por un monto de \$ 13.608,78.</li> </ul>	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	06/07/2017 - 12:27 PM
<p><b>MAYO 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reporta a la Dirección de Seguimiento, Planes y Programas como liquidados dos contratos de obra. Ver anexo C4.</li> <li>- El SECOB publica en la pagina del Sistema Oficial de Contratación Publica, el proceso LC-SECOB-002-2017, para los Estudios Para el Diseño Definitivo de las Obras de Estabilización y Reforzamiento del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela.</li> </ul> <p><b>ABRIL 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reporta a la Dirección de Seguimiento, Planes y Programas como liquidados dos contratos de obra. Ver anexo C3.</li> </ul> <p><b>MARZO 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasta el mes de marzo se ha realizado la asignación de 26 contratos para proceder a la elaboración de los informes técnicos de liquidación. Según memorando No. MD-CPGE-2017-220, de fecha 29 de marzo de 2017, la Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica del MINDE, informa a la Coordinación de Administración de Infraestructura Deportiva que el 24 de marzo de 2017 se realizó la transferencia de recursos a favor del SECOB por un monto de \$189.827,63</li> </ul> <p><b>ENERO - FEBRERO 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos. Ver anexo C2</li> </ul>	Galvez Freire, Hernan Patricio	06/06/2017 - 11:56 AM
<p><b>DICIEMBRE 2016.-</b> En el mes de diciembre del 2016 se realiza una inspección al CEAR Carpuela con la finalidad de verificar el estado actual junto con técnicos del SECOB, en esta inspección se efectúa una reunión de trabajo en donde el SECOB entrega las Actas de Recepción Definitiva del contrato principal y contrato complementario, es importante indicar que las actas se firmaron el 08 de julio del 2016 y son entregadas al Ministerio del Deporte en el mes de Diciembre.</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	18/04/2017 - 09:53 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2016:</b> El 14 de noviembre de 2016 el Ministerio del Deporte envía la SECOB la Nota Reversal con la finalidad de contratar los Estudios para el Diseño definitivo de las obras de estabilización del CEAR CARPUELA.</p> <p>El 17 de noviembre de 2016 mediante oficio No. SECOB-CGGJ-2016-0088-O, el SECOB envía la aceptación de la nota reversal planteada por el Ministerio del Deporte para la contratación de los estudios definitivos de las obras de estabilización y reforzamiento del CEAR CARPUELA.</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	21/12/2016 - 09:23 AM
<p><b>OCTUBRE 2016:</b> En el mes de octubre se realiza una nueva inspección por parte de un técnico de la Dirección de Infraestructura para verificar el estado actual así como verificar las observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.</p> <p>Mediante memorando No. MD-CGAID-2016-0246 de fecha 26 de octubre de 2016, la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportiva informa a la Ministra Subrogante del Ministerio del Deporte, el estado actual de las instalaciones del CEAR CARPUELA así como las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado de acuerdo al informe DAPyA-0034-2016.</p> <p>Se informa además que es necesario gestionar los recursos para la contratación de una consultoría que permita salvaguardar la inversión realizada y establecer la prioridad en la ejecución de las obras civiles complementarias.</p> <p>El 28 de octubre se realiza una reforma al plan anual de contratación del Ministerio del Deporte con la finalidad de obtener recursos que permitan la contratación de los estudios para el diseño definitivo de las obras de estabilización y reforzamiento del centro de entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela.</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	09/12/2016 - 11:39 AM
<p><b>AGOSTO 2016:</b> En el mes de agosto de 2016 la EP de la Escuela Politécnica Nacional envía la MINDE la propuesta definitiva respecto a los estudios que consideran necesario para la estabilización de la plataforma y edificaciones, tomando en cuenta que las edificaciones existentes, de acuerdo a la consultoría contratada por SECOB indica que no tiene afectaciones de consideración, la propuesta contempla dos etapas de entrega:</p> <p>ETAPA 1: Diagnostico</p> <p>ETAPA 2: Anteproyecto y Proyecto Definitivo.</p> <p>Estudios Geotécnicos, Estudios Estructurales, Estudios Hidráulica e Hidrosanitaria, Estudios de laboratorio, Presupuesto y especificaciones técnicas.</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	09/12/2016 - 11:38 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO-JULIO-JULIO 2016: Desde el mes de mayo hasta el mes de julio se revisa la documentación de la obra correspondiente al CEAR de Rio Verde con la finalidad de elaborar los términos de referencia para poner a consideración de la máxima autoridad la contratación de los estudios de Consultoría de la Regularización Ambiental de los Centros de Alto Rendimiento de Carpuela y Rio Verde.</p> <p>En el mes de mayo se realiza una inspección por parte de un técnico de la Dirección de Infraestructura Deportiva con la finalidad de verificar el estado actual del CEAR.</p> <p>De la inspección se determina que los asentamientos que se presentan en la plataforma de acceso han disminuido sin embargo, existen otras áreas con el bloque de halterofilia donde se ha presentado fisuras y es necesario contratar una consultoría que entregue los estudios definitivos que deben ser implementados a fin de estabilizar tanto las estructuras como las plataformas. Con la finalidad de obtener costos referenciales y el apoyo de especialistas que permitan obtener estudios para la estabilización de la plataforma y las edificaciones, se solicita a la EP de la Escuela Politécnica Nacional su apoyo, para lo cual se desarrollan varias reuniones de trabajo desde el mes de mayo.</p>	<p>Nieto Salas, Cristian Mauricio</p>	<p>09/12/2016 - 11:37 AM</p>
<p>MARZO 2016: En la intención de continuar con el proceso de transferencia de los CEARs a la EP CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO el Ministerio del Deporte solicita al SECOB como entidad ejecutora, remitir toda la información técnica (contrato, informes de obra, actas de recepción, manuales de uso y mantenimiento, catálogos de equipo entre otros) respecto al CEAR Carpuela.</p> <p>En el mes de marzo el SECOB remite la información correspondiente al contrato, inventario de infraestructura, actas de recepción provisional y definitiva del contrato complementario, acta de uso de instalaciones, planos AS BUILT, catálogo de equipos, cumplimiento de compromisos del contratista.</p> <p>ABRIL 2016: Mediante memorando No. MD-CGAID-2016-0126 de 13 de abril de 2016 la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinación General de Panificación proceder a la congelación del proyecto "Construcción del proyecto integral complementario para el centro de formación y desarrollo de deportes Carpuela en el cantón Carpuela, provincia de Imbabura" considerando que de acuerdo al Decreto ejecutivo 992 del 29 de diciembre de 2011 y 049 del 22 de julio de 2013, se crea el Instituto de Contratación de Obras ICO actualmente SECOB, esta entidad tiene como objetivo principal contratar la ejecución de obras de infraestructura que requieren las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, dentro de las cuales se encuentra el Ministerio del Deporte, con estos antecedentes se informa que el SECOB se encuentra en proceso de liquidación técnica y económica de esta obra por lo que aún no se ha remitido esta información al Ministerio del Deporte.</p>	<p>Nieto Salas, Cristian Mauricio</p>	<p>09/12/2016 - 11:36 AM</p>
<p>ENERO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Aprobación del POA por medio del Memorando Nro. MD-CGP-2015-0028, del 22 de enero de 2015.</li> <li>2.- Mediante Memorando No. MD-DGID-2015-0071 del 27 de enero de 2015 se solicita cambio de fecha en los Hitos GPR.</li> <li>3.- Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0005 de fecha 29 de enero de 2015 se solicitó que se realicen las gestiones necesarias para la transferencia de recurso MD-SECOB por el monto \$ 1.009.945,46.</li> </ol> <p>FEBRERO-ABRIL 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Mediante Oficio No. SECOB-DG-2015-0374-O de fecha 04 de marzo de 2015 SECOB realiza la entrega de documentación de la Primera Fase de la Consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA"</li> <li>2.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-1955 de fecha 06 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB el Estado Actual de la Consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA"</li> <li>3.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-2459 de fecha 23 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB las fechas de entrega de las próximas fases de la consultoría que se encuentra en ejecución.</li> <li>4.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0082-O de fecha 06 de abril de 2015 SECOB informa que el día 08 de abril de 2015 se realizara la socialización de la Segunda Fase de la consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA"</li> <li>5.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0085-O de fecha 08 de abril de 2015 SECOB realiza la Entrega de la información correspondiente a la Fase II de la consultoría que se encuentra en proceso de ejecución, solicitando informe técnico con recomendaciones y observaciones respecto a los productos entregados.</li> </ol>	<p>Nieto Salas, Cristian Mauricio</p>	<p>28/10/2015 - 10:03 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6.- Mediante Oficio No MD-DGID-2015-0019-OF de fecha 15 de abril de 2015 se remite a SECOB el informe técnico en el cual se incluye conclusiones y recomendaciones correspondientes a los productos de la FASE II de la consultoría en ejecución.</p> <p>7.- Mediante Oficio No. MD-CGAID-2015-0050-OF de fecha 30 de abril de 2015 se solicita a SECOB información sobre expropiaciones que se hayan realizado para la construcción de la vía de Acceso al CEAR Carpuela.</p>		
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Acta de Entrega - Recepción Definitiva no se podrá cumplir hasta el 31 de Diciembre de 2014</p> <p>2.- El consultor designado para el " Estudio de Consultoría de Riesgo Estructural", N° CD-0022-SECOB-2014 firmado el 19 de noviembre de 2014, se está esperando la entrega de la Primera Fase</p> <p>3.- El avance físico de la obra corresponde al 100%.</p>	<p>Nieto Salas, Cristian Mauricio</p>	<p>30/01/2015 - 10:10 AM</p>
<p>OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas observaciones en el Centro de Alto rendimiento y que el contratista no ha realizado los trabajos que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por esta razón no es procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>16/12/2014 - 09:40 AM</p>
<p>AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas observaciones en el Centro de Alto rendimiento y que el contratista no ha realizado los trabajos que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por esta razón no es procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>15/12/2014 - 05:08 PM</p>
<p>JUNIO Y JULIO 2014:</p> <p>1.- El informe técnico y fotográfico de inspección CEAR Carpuela, abarca las visitas realizadas en los meses de Junio y Julio del presente año, debido a que el avance de la obra es mínimo.</p> <p>2.- En la cancha de césped sintético se debe realizar una nivelación de ciertos sectores de la cancha, el retiro de la arena colocada y en su remplazo arena silícica especificada, para posteriormente proceder al peinado del material sintético.</p> <p>3.- Por el sinnúmero de observaciones existentes en todas las áreas del complejo deportivo no es recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército mientras dichos trabajos no se encuentren concluidos en su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte .</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>19/08/2014 - 05:43 PM</p>
<p>ABRIL Y MAYO 2014:</p> <p>1.-Recepción definitiva no se ha cumplido hasta la fecha, debido a que no se han realizado las correcciones respectivas.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>19/08/2014 - 05:36 PM</p>
<p>MARZO 2014:</p> <p>2.-Recepción definitiva no se ha cumplido y es muy probable que al 31 de Marzode 2014 tampoco se tenga el mencionado documento. Debido a que en algunas edificaciones existen diferentes cuarteamientos en paredes, piso, cerámica, producido por asentamientos. El SECOB indica que el Ministerio del Deporte debe comunicar al contratista que realizo dichos trabajos de estructuras para la reparación de las misma, ya que está afectando los acabados realizados, por esta razón no se firma el acta de recepción definitiva.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>19/08/2014 - 05:36 PM</p>
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1.- El 06 y 07 de febrero de 2014 viajaron al Complejo Deportivo de Carpuela funcionarios del SECOB, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y del Ministerio del Deporte para verificar los problemas que se han presentado luego de la recepción provisional de la obra. Las canchas de exteriores de uso múltiple se pudo constatar el crecimiento de las juntas de dilatación construidas entre los paños de las canchas, el asentamiento afecta incluso al graderío, se muestra cuarteado.</p> <p>2.- El coliseo de uso múltiple desde el exterior se puede observar que el material de recubrimiento de la ventana posterior superior del coliseo, se encuentran desprendidas y no han sido reparadas. Las puertas metálicas de los camerinos ubicados en los costados del coliseo y bajo la tribuna, no se abren con facilidad ya que las puertas topan contra el suelo por estar descuadradas, dificultando su apertura, existen problemas en las instalaciones eléctricas no se prenden las lámparas, faltan colocar piezas eléctricas, existe humedad en el cielo raso bajo los baños de la planta alta.</p> <p>3.- Por el sinnúmero de observaciones existentes en todas las áreas del Complejo Deportivo, no es recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada por el cuerpo de Ingenieros del Ejército, mientras dichos trabajos no se encuentren concluidos en su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>13/03/2014 - 11:28 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2014:</p> <p>1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de \$ 22.886.283,56; del cual, \$ 1.402.777,37 corresponden al Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura".</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0044, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura".</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>04/02/2014 - 10:27 AM</p>
<p>1 AL 31 DE AGOSTO.</p> <p>Esta pendiente la firma de recepción definitiva del proyecto, responsabilidad del SECOB para que pueda entregar la obra al Ministerio del deporte, se ha insistido para que se proceda con este compromiso sin tener una respuesta favorable al requerimiento, preocupa porque los deportistas de la Provincia de Imbabura y del país ya están haciendo usos de las instalaciones, se han presentado observaciones constructivas a corregirse por parte de esta gerencia, ha pasado más de un año sin recibir respuesta, los planos as bit no entrega el SECOB al Ministerio del Deporte, de igual manera no se entrega oficialmente los equipos existentes y hasta la fecha no se realiza las capacitaciones ni entrega de manuales para la operación y mantenimientos de la planta paquete de agua potable, de los sistemas de bombeo, de las redes eléctricas y de sistemas de voz y datos.</p> <p>Se ha solicitado que el SECOB intervenga en generar estudios de suelo para determinar la falla geológica presentada en la zona de bloques educativos, donde se ha producido asentamientos afectando la estructura y paredes del bloque de aulas ubicado al pie del cerramiento principal y generar soluciones dependiendo de lo que arroje la consultoría.</p> <p>De igual manera se requiere intervención en el coliseo de usos múltiples que también presenta asentamientos geológicos en un extremo de la estructura, aquí la situación es más crítica porque se puede asentar la cubierta si no se detiene el desplazamiento existente, el SECOB tiene conocimiento de todas estas observaciones.</p> <p>Se espera el pronunciamiento del Administrador del contrato SECOB para viabilizar todos estos inconvenientes</p>	<p>Córdova Peñafiel, Italo Alejandro</p>	<p>05/09/2013 - 05:41 PM</p>
<p>1 AL 30 JUNIO</p> <p>El Ministerio del Deporte ha estado insistiendo que se cumplan los procesos pendientes a ejecutarse en el Centro de Entrenamiento de Carpuela para proceder con la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se espera por parte del ICO como Administrador del Contrato, la comunicación de que se han cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, como también de que se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en proceso constructivo del proyecto para su revisión.</p> <p>Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable.</p> <p>Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO a este Ministerio.</p>	<p>Córdova Peñafiel, Italo Alejandro</p>	<p>02/07/2013 - 09:25 AM</p>
<p>1 AL 31 MAYO 2013:</p> <p>A la fecha está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no existe por parte del ICO como Administrador del Contrato, la comunicación de que se han cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, como también de que se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en proceso constructivo del proyecto.</p> <p>Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar esta entrega el 16 de Abril del presente año, pero por no encontrarse llena la cisterna de la planta no se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua potable.</p> <p>Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO a este Ministerio.</p>	<p>Córdova Peñafiel, Italo Alejandro</p>	<p>24/06/2013 - 12:05 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1 AL 30 ABRIL</p> <p>Sigue pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en proceso constructivo del proyecto.</p> <p>Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar esta entrega el 16 de Abril del presente, pero por no encontrarse llena la cisterna de la planta no se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua potable. Se han capacitado a técnicos del Ministerio del Deporte la operación y mantenimiento de los tableros de control de los transformadores y equipos eléctricos del CEAR, como también de las cámaras de control y seguridad instaladas en el complejo.</p> <p>Se espera que el contratista cumpla con todos estos compromisos y observaciones pendientes que corregir, para que el ICO oficialice la fecha para proceder con la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra.</p>	<p>Córdova Peñafiel, Italo Alejandro</p>	<p>30/04/2013 - 01:02 PM</p>
<p>15 AL 31 MARZO</p> <p>Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en el proyecto.</p> <p>Con fecha 21 de Marzo del 2013 me traslado al CEAR de Carpuela para atender pedido del ICO con el acompañamiento para recibir por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército las diferentes unidades de sistemas en equipos y bombas instalados en áreas específicas para el funcionamiento del Centro de entrenamiento, competencia en su primera fase de recepción del Instituto de Contratación de Obras.</p> <p>Comunico la preocupación urgente de solucionar la falla estructural por asentamiento que está ocurriendo en el bloque educativo fachada posterior central del edificio, se detecta cuarteamientos de considerable magnitud en las paredes y columnas del bloque, como también existe desplazamiento en el cerramiento perimetral a la misma altura de la falla en el edificio, de las primeras conclusiones se observa que puede ser por la filtración de agua del canal de riego que pasa a tres metros del cerramiento y que se está filtrando subterráneamente por la mala compactación del suelo hasta el edificio.</p> <p>Se requiere ordenar oficialmente la intervención inmediata al ICO para solucionar inconvenientes mayores, verbalmente solicite se intervenga, pero esperan que se lo haga por escrito.</p> <p>Luego de esta inspección, nos reunimos con el Administrador del contrato del ICO Arq. Blas León, quien verbalmente nos solicita que recibamos los equipos y bombas al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a la cuál conjuntamente con los delegados técnicos del Ministerio del Deporte nos oponemos al pedido indicándole que no es el procedimiento técnico, ya que el proceso es de que el ICO con sus respectivos técnicos especialistas reciban al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los equipos correspondientes bajo su entera responsabilidad, con sus respectivos diagramas, planos, manuales de funcionamiento y operación, luego emitir un informe de recibido a satisfacción bajo su responsabilidad y procedan a entregarnos al Ministerio del Deporte con el complemento de generar un cronograma con fechas y días para la capacitación por parte del Cuerpo de Ingenieros al personal del Ministerio que se va a encargar de las operaciones y mantenimiento de los equipos y sistemas.</p> <p>Lamentablemente nunca se dio la presencia de los responsables de las instalaciones de equipos y sistemas contratados, ni tampoco estuvieron técnicos especialistas eléctricos e hidrosanitarios del Instituto de Contratación de Obras responsables de recibir lo solicitado, mal coordinada esta visita por no contar con las personas y técnicos responsables de entregar los sistemas, como también de los técnicos del ICO responsables de recibir los equipos.</p> <p>Se espera que el ICO oficialice por escrito una nueva fecha con las indicaciones entregadas para generar un proceso técnico adecuado y con la presencia de técnicos del ICO que certifiquen de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas la funcionabilidad de los equipos y sistemas a recibir el Ministerio del Deporte.</p>	<p>Córdova Peñafiel, Italo Alejandro</p>	<p>31/03/2013 - 09:57 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>28 DE FEBRERO 2013</p> <p>Se encuentra pendiente la comunicación oficial por parte del Instituto de Contratación de Obras ICO, de las observaciones a corregirse por parte del contratista "Cuerpo de Ingenieros del Ejército", remitidos por la Gerencia del Ministerio del Deporte con fecha 13 de Diciembre del 2012, se recalca al equipo de fiscalización del ICO y al Administrador del Contrato que es su responsabilidad el verificar y constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas solicitándose que se ordene al Contratista CEE proceder con las correcciones de las diferentes observaciones arquitectónicas y de Ingenierías que se presentan en todos los edificios del proyecto.</p> <p>Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en el proyecto.</p> <p>Hasta la presente fecha no se ha cumplido con todos los requerimientos planteados ni con los compromisos asumidos en las reuniones de SNAP por parte de las responsables de la entrega de la obra al Ministerio del Deporte</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>27/02/2013 - 08:36 PM</p>
<p>AL 31 DE DICIEMBRE 2012: Al 20 de Julio de 2012, esta Gerencia generó cerca de 120 observaciones a corregir, las mismas que se ratifican para su cumplimiento el 18 de Octubre de 2012, fecha en que se firma el Acta de Recepción Provisional, donde se anexa nuevamente el requerimiento de cumplir con las observaciones constructivas, todos esos requerimientos deben cumplirse hasta la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, que son 90 días después de la firma del Acta Provisional.</p> <p>Hasta la fecha se han presentado imprevistos constructivos de las obras anteriores al proyecto contractual, tales como fallas constructivas de asentamiento estructural de la pared posterior del coliseo de usos múltiples, donde se tuvo que diseñar una propuesta estructural para corregir en el menor tiempo posible los problemas de asentamientos que afectaban a las columnas y vigas inferiores y superiores de la pared posterior del coliseo, las mismas que se visualizaban en el piso y paredes del edificio, sino se tomaba la decisión de intervenir, se hubiese generado el asentamiento de la cubierta estructural por el desplazamiento de las columnas del lado noreste, proceso que demoró aproximadamente 3 meses en ser resuelto.</p> <p>Otro de los inconvenientes fue el proceso de instalación del material sintético en la pista atlética, el mismo que acarrea procesos constructivos mal concebidos desde años atrás, y además con la terminación unilateral por incumplimiento de implementación de la pista por parte de la Federación Deportiva del Carchi. En este período se tuvo que solicitar al ICO, la intervención de las correcciones técnicas de la pista, como el levantamiento de la capa asfáltica instalada, que presentaba un deterioro por el trajinar de maquinaria pesada sobre el anillo de la pista por los trabajos de reacondicionamiento del Centro de Entrenamiento, por lo que, el Ministerio del Deporte asume la responsabilidad inmediata de contratar una nueva pista de material sintético, y ordenar al Instituto de Contratación de Obras, que asuma la corrección de la pista atlética y la cancha de césped natural que estaba mal construida, ya que no se encontraba al nivel de la pista atlética que es lo que reglamentariamente se recomienda.</p> <p>El ICO concluyó los trabajos de nivelación de la pista con el nuevo material asfáltico, el técnico contratado por el Ministerio del Deporte, procederá a la colocación del material sintético, previo a que el material asfáltico cumpla con el proceso de secado de los materiales aceitosos que arroja, este proceso se desarrollará en los primeros días del mes de Enero de 2013.</p> <p>Todos estos imprevistos generan que los tiempos para la terminación y entrega del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, vayan generando prórrogas y aplazamientos en la fecha de terminación. Los procesos y observaciones de correcciones se están cumpliendo paralelamente con la implementación del equipamiento del Centro.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>11/01/2013 - 06:51 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012:</p> <p>Se generan observaciones específicas en las áreas del Coliseo de usos múltiples y Pista atlética, donde se generan inconvenientes urgentes a resolver.</p> <p>COLISEO DE USOS MÚLTIPLES.- El Ministerio del Deporte solicita al ICO en el mes de Agosto, la intervención inmediata para corregir deficiencias estructurales en la cimentación y columnas del lado este, donde se produce asentamientos que originan el cuarteamiento de las vigas de amarre superiores e inferiores, provocando el desplazamiento de la plataforma de la cancha y de las paredes por el asentamiento de las bases de las columnas del ala este.</p> <p>En el mes de Octubre se generan trabajos de reforzamiento del terreno del lado norte del coliseo con la construcción de un muro de hormigón armado en todo el largo lateral del mismo, con esto se estabiliza el desplazamiento que existía del terreno, y se realizaron ensayos de laboratorio para verificar el tipo de suelo existente en el sector, confirmandose un suelo de relleno inestable y sin la compactación adecuada, no se realizó mejoramiento de suelo simplemente se relleno</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>11/12/2012 - 11:28 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>con material del sitio proveniente de las laderas del cerro. En el mes de Noviembre se trabaja en el reforzamiento de los cimientos (plintos) los mismos que no tenían el calculo adecuado para generar el soporte de las cargas que iban a recibir, estos no cumplían técnicamente el espesor y diámetros necesarios para su absorber los esfuerzos a producirse, se refuerzan los dados a un diámetro de 1.50x1.50 con una altura de 1.50, para estabilizar y absorber las cargas producidas por la estructura de la cubierta, En el mes de Diciembre se trabaja en el reforzamiento de las vigas inferiores y superiores con la colocación de placas de acero de refuerzo sujetando la viga en el área de corte producida por las cargas y desplazamientos, se colocan en la parte posterior de la pared unos anclajes de acero para sostener y estabilizar la pared posterior del coliseo, la misma que por su altura y los fuertes vientos que corren en la zona vibra produciendo afectación a la estructura de la cubierta.</p> <p>PISTA ATLÉTICA.- Con la visita del Sr. Ministro en el mes de Septiembre, se solicita intervenir en la corrección y nivelación de la cancha de césped de la pista atlética y la colocación de la pista sintética reglamentaria en el anillo existente de la pista. En el mes de Octubre se comienzan los trabajos de reconformación y nivelación de la cancha de césped la misma que se encontraba a o.45cm más alto que el nivel de la pista atlética, siendo esto antirreglamentario para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas del atletismo, para el mes de Noviembre se trabaja en el levantamiento del asfalto de la pista por su deterioro y desniveles, en los primeros días del mes de Diciembre se comienza a nivelar y compactar la base de la pista de acuerdo a las recomendaciones técnicas presentadas por el Ministerio del Deporte a través del contratista encargado de la instalación de la pista sintética, este es el proceso más importante para que la pista cumpla con los requerimientos técnicos, se tienen que verificar por tramos de 3 a 5 metros los niveles de la base que se compacta no puede ser mayor a 1% la pendiente de la pista hacia la cuneta perimetral, luego de la nivelación el siguiente paso es la colocación del asfalto verificar de igual manera sus niveles y proceder luego a que se seque todas las impurezas aceitosas que arroja este material para que no produzca el rechazo de adherencia del material sintético al asfalto, antes de su colocación se debe limpiar o lavar el asfalto para proceder a la instalación del material sintético de la pista, a la fecha se trabaja en el impregnado de la pista previo a la colocación del asfalto.</p>		
<p>AL 30 AGOSTO.- Se entregan observaciones al ICO correspondiente a deficiencias constructivas presentadas en la obra física, estos detalles se deberán ejecutar antes de generar el Acta de Resepción Provicional, estas observaciones son generadas por esta Gerencia para que por intermedio del ICO se las hagan llegar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se cumplan para contar con una mejor funcionalidad del proyecto, además se entregan observaciones tecnológicas y eléctricas para ser consideradas para su respectiva corrección, es obligación del ICO hacer cumplir al CEE. estas correcciones para que el Ministerio del Deporte pueda recibir a satisfacción la obra.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>10/12/2012 - 03:44 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2012: El Ministerio del Deporte se encuentra en espera de la Recepción definitiva de la obra, a generarse ente el ICO y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Contratista). A la fecha el Ministerio del Deporte asume la responsabilidad de la administración y seguridad del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento; es responsabilidad del CEE según la Ley de Contratación de corregir cualquier falla constructiva, hasta la fecha que se genere el Acta de Recepción Definitiva.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>14/11/2012 - 11:10 AM</p>
<p>OCTUBRE 2012: Se ha procedido por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista de la obra a ejecutar y cumplir las observaciones para corregir detalles constructivos arquitectónicos, de voz y datos y eléctricos, presentados por la Gerencia del Ministerio del Deporte, para proceder a generar la recepción provisional del proyecto. El ICO Administrador del contrato deberá entregar previo a la firma del Acta de Recepción Provisional los planos rediseñados de las obras de ingeniería como son Hidrosanitarias, eléctricas y tecnológicas; la recepción provisional está prevista para su firma para el día 05 de Septiembre del 2012.</p> <p>Con fecha 18 de octubre de 2012, los miembros de la Comisión de Recepción Provisional se ratifican en el contenido del Acta y para constancia de ella la suscriben en cuatro ejemplares del mismo tenor y valor. En la localidad de Carpuela, Parroquia de Ambuquí, Cantón Ibarra de la Provincia de Imbabura, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: La Subsecretaría Técnica de Apoyo elaboró el informe con los justificativos del cambio de nombre del Proyecto de "Centro de Alto Rendimiento" a "Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento". La Consultoría para el Modelo de Gestión e Implementación para los Centros Deportivos de Rioverde y Carpuela, basó la ejecución de sus productos en el concepto de Centros para el Alto Rendimiento, pero como se señaló anteriormente, los espacios deportivos de los centros originalmente estuvieron diseñados para el deporte formativo. Durante la segunda etapa de construcción y finalización de las obras por la actual administración del Ministerio del Deporte, se concluyó que si bien la mayoría de espacios deportivos podían ser modificados para cumplir las normativas oficiales que el deporte de alto rendimiento requiere, otros no podían serlo.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>23/10/2012 - 09:54 AM</p>

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Es así que considerando la alta calidad de los servicios deportivos que pueden proveer los centros, y al mismo tiempo la visión del modelo de gestión, se ha definido que los centros se denominen "Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento" acogiendo la condición de híbrido entre instalaciones para la formación - desarrollo deportivo y deporte para el Alto Rendimiento.</p> <p>JULIO 2012: La obra física se terminó el 30 de junio de 2012, no se ha procedido a la firma del acta de recepción provisional porque hasta la presente fecha se realizan las pruebas de funcionalidad de toda la infraestructura hidrosanitarias, tecnológica y de climatización del complejo; además de correcciones constructivas que se han presentado durante la ejecución del proyecto, para mejorar en la presentación y acabado de la obra.</p> <p>JUNIO 2012: Se realizan las pruebas de funcionamiento de la planta de tratamiento, se solicita por parte del contratista, instalar una bomba de presión de 7 HP para dar mayor presión al caudal que sale del tanque de reserva. Está pendiente la firma de convenio con EMELNORTE. para la conexión del transformador de 300KWA instalado por el CEE. además solicitan implementar elementos de seguridad a los dos transformadores existentes, en espera de la firma del convenio para realizar estos trabajos. Avance del proyecto 98%</p> <p>MAYO 2012: Se ejecuta el proceso constructivo del tanque de reserva para tratamiento de agua potable, esta listo para el proceso de pruebas de llenado y filtración. Se generan trabajos de modificación del área de cocina, implementación del equipamiento necesario para su correcto funcionamiento. A través de EMELNORTE se procede a la implementación de energía eléctrica para la dotación del Complejo, y proceder a la conducción de la red trifásica para las pruebas de funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.</p>		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>4- ORGANIZACIONAL. * General.</b> La demora en trámites Jurídicos, financieros y el recorte de recursos CAUSARÍA retraso en el cierre y liquidación de contratos, necesarios para la terminación de proyectos.	06/02/2020	Marcos Eduardo Torres Santander	70 %	60	42	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Imbabura > Pimampiro

## HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 EJECUCIÓN: Acta entrega - recepción de los productos de la consultoría PIC - Carpuela entregada	9-Entregables Formales	25/03/2011		25/03/2011		Sí	1.14
2 EJECUCIÓN: Firma de actas de recepción y de mutuo acuerdo de contratos de arrastre realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2011		30/07/2011		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: Proyecto Integral Complementario al ICO entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2011		16/08/2011		Sí	1.14
4	EJECUCIÓN: Modificación Presupuestaria por reasignación de recursos a ICO realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2011		29/08/2011		Sí	1.14
5	EJECUCIÓN: Resolución de terminación unilateral de contratos de arrastre realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2011		31/08/2011		Sí	1.14
6	EJECUCIÓN: Traspaso de fondos al ICO ejecutado	5-Entregables Intermedios	09/09/2011		07/09/2011		Sí	1.14
7	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/10/2011		28/10/2011		Sí	1.14
8	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/11/2011		28/11/2011		Sí	1.14
9	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/12/2011		28/12/2011		Sí	1.14
10	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/01/2012		28/01/2012		Sí	1.14
11	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2012		16/03/2012		Sí	1.14
12	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	29/03/2012		29/03/2012		Sí	1.14
13	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	12/04/2012		12/04/2012		Sí	1.14
14	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	17/05/2012		17/05/2012		Sí	1.14
15	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	1.14
16	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	15/06/2012		15/06/2012		Sí	1.14
17	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	29/06/2012		29/06/2012		Sí	1.14
18	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	1.14
19	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	15/07/2012		15/07/2012		Sí	1.14
20	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	1.14
21	EJECUCIÓN: Acta de entrega provisional de obra por parte del ICO entregada	9-Entregables Formales	18/10/2012		18/10/2012		Sí	1.14
22	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de diciembre 2012	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.14
23	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de enero 2013	9-Entregables Formales	31/01/2013		31/01/2013		Sí	1.14
24	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 28 de febrero 2013	9-Entregables Formales	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.14
25	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento	9-Entregables Formales	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la obra entregado al 31 de marzo 2013							
26	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de Abril 2013	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.14
27	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de mayo 2013	9-Entregables Formales	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.14
28	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de junio 2013	9-Entregables Formales	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.14
29	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de julio 2013	9-Entregables Formales	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.14
30	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de agosto 2013	9-Entregables Formales	30/08/2013		30/08/2013		Sí	1.14
31	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de septiembre 2013	9-Entregables Formales	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.14
32	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de octubre 2013	9-Entregables Formales	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.14
33	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 29 de noviembre 2013	9-Entregables Formales	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.14
34	EJECUCIÓN: Solicitud de reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014, por disminución de recursos económicos cuentas de obras por liquidar realizada	5-Entregables Intermedios	22/01/2014		22/01/2014		Sí	1.14
35	EJECUCIÓN: Reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura" cuentas de obras por liquidar aprobada	5-Entregables Intermedios	29/01/2014		29/01/2014		Sí	1.14
36	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		20/02/2014		Sí	1.14
37	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Marzo 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.14
38	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Abril 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.14
39	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.14



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la obra de la obra Mayo 2014 realizado							
40	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Junio 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.14
41	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Julio 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.14
42	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Agosto 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.14
43	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Septiembre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.14
44	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Octubre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.14
45	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Noviembre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.14
46	EJECUCIÓN: POA proyecto 2015 aprobado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	1.14
47	EJECUCIÓN: Liquidación Cuentas de arrastre - SECOB realizado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.14
48	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de marzo 2015	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.14
49	EJECUCIÓN: Informe de Revisión Fase 2 de los Productos de Consultoría Externa del análisis de riesgo CEAR Carpuela	9-Entregables Formales	01/04/2015		01/04/2015		Sí	1.14
50	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Abril 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.14
51	EJECUCIÓN: Informe Final de Revisión Fase 3 de los Productos de Consultoría Externa del análisis de riesgo CEAR Carpuela realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	1.14
52	EJECUCIÓN: Solicitud de información del contrato, manuales de funcionamiento, garantías de equipos, actas al SECOB realizada	1-Solicitud de Información	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.14
53	EJECUCIÓN: Solicitud de congelación de proyectos en GPR hasta que SECOB realice liquidación de la obra realizada.	9-Entregables Formales	15/04/2016		15/04/2016		Sí	1.14
54	EJECUCIÓN: Términos de Referencia para proceso ambiental e inspección para	5-Entregables Intermedios	04/07/2016		04/07/2016		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	verificar estado actual del complejo elaborado							
55	EJECUCIÓN: Acta de recepción definitiva de la obra por parte del ICO firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	16/07/2016		16/07/2016		Sí	1.14
56	EJECUCIÓN: Agosto 2016: Se coordina con la Escuela Politécnica Nacional la presentación de una propuesta técnica para la elaboración de los estudios	5-Entregables Intermedios	12/08/2016		12/08/2016		Sí	1.14
57	EJECUCIÓN: Octubre 2016: Informe de inspección para verificar estado actual del complejo.	5-Entregables Intermedios	19/08/2016		19/08/2016		Sí	1.14
58	EJECUCIÓN: Noviembre 2016: MINDE propone al SECOB una nota reversal para la contratación de los estudios definitivos de estabilización de las plataformas del complejo.	5-Entregables Intermedios	12/11/2016		12/11/2016		Sí	1.14
59	EJECUCIÓN: Entrega del acta de recepción definitiva del contrato complementario y contrato principal firmada el 08 de julio de 2016 por parte del SECOB realizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/12/2016		15/12/2016		Sí	1.14
60	EJECUCIÓN: Informe anual del proyecto (2016)	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.14
61	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte marzo 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.14
62	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos para los "Estudios para el diseño definitivo de las obras de estabilización y reforzamiento del centro de entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela"	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.14
63	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte abril 2017 realizado	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	1.14
64	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte mayo 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/05/2017		31/05/2017		Sí	1.14
65	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultoría de arrastre ejecutado por el Ministerio del Deporte julio 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/07/2017		31/07/2017		Sí	1.14
66	EJECUCIÓN: Informe técnico de tres contratos de obra, fiscalización y consultorías	9-Entregables Formales	29/09/2017		29/09/2017		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte septiembre 2017 realizado							
67	EJECUCIÓN: Informe técnico de tres contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte noviembre 2017 realizado	9-Entregables Formales	26/12/2017		26/12/2017		Sí	1.14
68	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Enero 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.14
69	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Febrero 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.14
70	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Marzo 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.14
71	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Abril 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.14
72	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Mayo 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.14
73	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Junio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.14
74	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Julio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.14
75	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Agosto 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.14
76	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Septiembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
77	EJECUCIÓN: Informe técnico de cinco contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Noviembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.12
78	EJECUCIÓN: Informe técnico de cuatro contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Octubre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.12
79	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Diciembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.12
80	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.21
81	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.21
82	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre enero a marzo de 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.21
83	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.21
84	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre abril a junio de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		12/12/2019		Sí	0.21
85	CIERRE: Pago a la Aseguradora para continuar con el proceso de liquidación del contrato 102-DJ-2008	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		31/08/2019		Sí	0.21
86	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de enero a julio de 2019	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.21
87	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.21
88	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre julio a septiembre de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.21
89	CIERRE: Pago para continuar con el proceso de liquidación del contrato 102-DJ-2008 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.21
90	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de agosto a noviembre de 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
91	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre octubre a diciembre de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.2
92	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.15
93	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	0.15
94	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre enero a marzo de 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.2
95	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.15
96	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/05/2020			No	0.15
97	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de enero a junio de 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.25
98	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre abril a junio de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.2
99	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.15
100	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020			No	0.15
101	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre julio a septiembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.2
102	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.15
103	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.15
104	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de julio a diciembre de 2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.25
105	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre octubre a diciembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.2
106	COMPLETADO: Hitos Planificación 2021, Informe final de cierre	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	5.0


**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión-Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	25/11/2016
2	Historico - En la visita realizada el viernes 09-12-2011, al lugar donde se construye el "Centro de Formación de deportes colectivos en el sector de Carpuela en la Provincia de Imbabura, se pudo o	Rivadeneira Burbano, Gabriela Alejandra	{PR} - Provincia - IMBABURA	13/12/2011
3	Historico - ESTA ABANDONADA LA OBRA	Davila Guevara, Pedro Jorge	{PR} - Provincia - IMBABURA	22/06/2011

**ACCIONES CLAVE**

	T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1		TOMAR CONTACTO CON MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CONOCER EL MOTIVO DE SUSPENSIÓN OBRA, EN VIRTUD DE QUE SE ESTA DETERIORANDO	Rivadeneira, Adrián	Davila Guevara, Pedro Jorge	22/06/2011	22/06/2011	Alta

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de contratos de obra y fiscalización liquidados		-	-	-	01/01/2020	-




**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,473,203.78 **
Costo Total:	21,445,582.18
Total Devengado:	18,447,751.93
% Costo Total Devengado:	86.02 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 86.02 %

**Perfil Económico 2020**

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,434,116.45	25,451.85	0.00	<b>10,459,568.30</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	<b>5,170,379.80</b>	<b>25,451.85</b>	<b>0.00</b>	<b>5,195,831.65</b>
Ppto. Codificado	18,617,616.30	0.00	0.00	<b>18,617,616.30</b>
Ppto. Comprometido	1,471,605.29	0.00	0.00	<b>1,471,605.29</b>
Planeado - Codificado (2020)		25,451.85		
<b>Programado a Devengar</b>	<b>18,548,138.54</b>	<b>25,451.85</b>	<b>0.00</b>	<b>18,573,590.39</b>
Ppto. Devengado	18,447,751.93	0.00	0.00	<b>18,447,751.93</b>
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Estimado a fin de año	* 18,447,751.93	0.00	0.00	<b>18,447,751.93</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	100,386.61	25,451.85	0.00	<b>125,838.46</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.46 %	0.00 %	0.00 %	<b>99.32 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	<b>166,242.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,242.65</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	<b>130,245.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,245.57</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020**

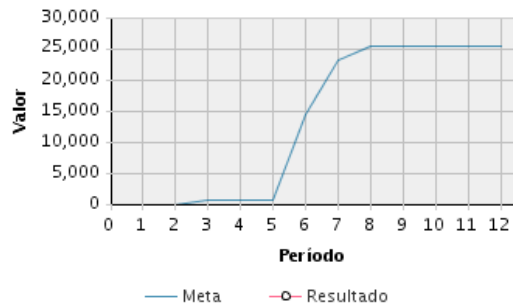

**Presupuesto Mensual 2020**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	717.44		717.44				
Abr	0.00		717.44				
May	0.00		717.44				
Jun	13,575.26		14,292.70				
Jul	8,735.24		23,027.94				
Ago	2,238.29		25,266.23				
Sep	0.00		25,266.23				
Oct	0.00		25,266.23				
Nov	185.62		25,451.85				
Dic	0.00		25,451.85				
<b>Total</b>	<b>25,451.85</b>						

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física MEDIANTE la planificación, diseño, construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Entrega de informe justificativo periodo Julio 2019	G-09.pdf	05/08/2019
2	A.1. Informe Especial	INF.ESPECIAL_Formato_corregido.docx	06/01/2012
3	A.2 Oficio SECOB	Oficio_para_Mayor_Checa_ICO._21-12-11.docx	06/01/2012
4	A.3 Oficio	Oficio_para_C_I_Ej._21-12-11.docx	06/01/2012
5	A.4. Circular para involucrados	CIRCULAR_NO._1_PARA_TODOS.docx	06/01/2012
6	A.5. Resumen Ejecutivo 2008-2011	Resumen_Ejecutivo_DICIEMBRE_2008-_2011.doc	26/01/2012
7	A.6. Oficio contestando comentario de Gobernadora Imbabura en Evaluación Ejecutiva	Oficio_a_Gobernadora_Imbabura.pdf	09/02/2012
8	A.7. Informe al 31 enero/2012	INFORME_FINAL_CARPUELA.pdf	09/02/2012
9	A.8. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 16-03-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_16-03-2012.pdf	12/06/2012
10	A.9. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 29-03-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_29-03-2012.pdf	12/06/2012
11	Aprobación de la reprogramación al POA	E-08.pdf	04/07/2018
12	B.1. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 12-04-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_12-04-2012.pdf	12/06/2012
13	B.2. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 17-05-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_17-05-2012.pdf	12/06/2012
14	B.3 Informe de actividades y seguimiento Carpuela 31-05-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-05-2012.pdf	12/06/2012
15	B.4. Oficio de respuesta a Gobernadora de Imbabura-Proyecto Centro de Alto Rendimiento en Carpuela	Oficio_respuesta_a_Gobernadora_de_Imbabura.pdf	15/06/2012
16	B.5. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 15-06-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-06-2012.pdf	12/06/2012
17	B.6. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 30-06-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_30-06-2012.pdf	12/07/2012
18	B.7. Resumen Ejecutivo Enero-Abril 2012	Resumen_Ejecutivo_ENERO-ABRIL_2012.doc	17/07/2012
19	B.8. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 15-07-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-07-2012.pdf	12/07/2012
20	B.8. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 31-07-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-07-2012.pdf	12/09/2012

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	B.9. Informe Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento "Carpuela y Rio verde"	Resumen_Ejecutivo-Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_Carpuela_y_Rio_verde.pdf	10/09/2012
22	C.1. Problemas no resueltos Enero 2011 a Mayo 2012	Problemas_no_resueltos_Enero_2011_a_Mayo_2012.doc	04/10/2012
23	C.2. Acta de entrega recepción provisional Centro de Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos en Carpuela	Acta_de_entrega_recepción_provisional_Centro_de_Formación_y_Developarrollo_de_Deportes_Carpuela.pdf	23/10/2012
24	C.3. Reporte de transferencias al ICO 2012-Carpuela	Reporte_de_transferencias_al_ICO-Carpuela_Rio_verde_y_CAR_CUECA_2012.pdf	05/12/2012
25	C.4. Informe de actividades y seguimiento Carpuela 31-12-2012	Informe_de_seguimiento_y_avances-Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf	28/01/2013
26	C.5. Informe de Gestión Gerente Diciembre 2012 seguimiento Carpuela	Informe_de_seguimiento_y_avances-Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf	27/02/2013
27	C.6. Informe de Gestión Gerente Enero 2013 seguimiento Carpuela	Informe_de_Gestión_Gerente_seguimiento_Carpuela_al_31-01-2013.pdf	27/02/2013
28	C.7. Informe de actividades y seguimiento Carpuela al 28 febrero 2013	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_al_28_febrero_2013.pdf	28/02/2013
29	C.8. Oficio Priorización SENPLADES-Proyectos de Inversión	Oficio_Priorización_SENPLADES-Proyectos_Inversión.pdf	04/03/2013
30	C.9. Informe de actividades y seguimiento Carpuela al 31-03-2013	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_al_31_de_marzo_2013.pdf	01/04/2013
31	D.1. Cumplimiento Hito 26	carpuela_30_Abril.jpg	15/05/2013
32	D.2. Cumplimiento HITO 27	oficio_74.pdf	03/06/2013
33	D.3. Cumplimiento Hito 28	carpuela_30_junio.pdf	02/07/2013
34	D.4. Cumplimiento HITO 35	A1_Cumplimiento_HITO_35.pdf	04/02/2014
35	D.5. Cumplimiento HITO 36	A2_Cumplimiento_HITO_36.pdf	04/02/2014
36	D.6. Cumplimiento Hito 37 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado	A3.pdf	20/02/2014
37	D.7. Informe de actividades y seguimiento Carpuela-Junio y Julio 2014	A4-Cumplimiento_HITOS_41_y_42.pdf	19/08/2014
38	D.8. Oficio actualización del dictamen de prioridad del proyecto	A5_Oficio_actualización_del_dictamen_de_prioridad.pdf	29/08/2014
39	D.9. Cumplimiento hito 44 Informe de visita realizada septiembre 2014	A6.pdf	24/10/2014
40	E.1. Memorando No MD-DGID-2015-0071	A7.pdf	05/02/2015
41	E.2. Memorando No MD-CGP-2015-0028	A8.pdf	05/02/2015
42	E.3. Informe de Abril 2015	A9_INFORME_ABRIL.pdf	17/04/2015
43	E.4. Informe Fase II Estudios Abril 2015	B1.pdf	17/04/2015
44	E.5. Informe Seguimiento mes de Marzo 2015	B2.pdf	17/04/2015
45	E.6. Oficio Entrega de la Revisión Fase II	B1.1.pdf	17/04/2015
46	E.7. Congelación de proyecto	C1.pdf	14/04/2016
47	E.8. Respaldo Marzo - Abril	MARZO_- _ABRIL.rar	09/12/2016
48	E.8. Solicitud inf. SECOB Abril	B3.pdf	15/05/2015
49	E.9. Respaldo Mayo - Julio	MAYO-JUNIO-JULIO.rar	09/12/2016
50	Entrega de informe justificativo de Riesgos a Septiembre 2019	H-03.pdf	10/10/2019
51	Entrega de informe justificativo periodo Noviembre 2019	H-05.pdf	10/12/2019
52	Entrega de informe justificativo periodo Octubre 2019	H-04.pdf	07/11/2019
53	F.1. Respaldo Agosto	AGOSTO.rar	09/12/2016
54	F.2. Respaldo Octubre	OCTUBRE.rar	09/12/2016
55	F.3 Respaldo Noviembre	NOVIEMBRE.rar	09/12/2016
56	F.4. Actas Definitivas	ACTAS.rar	21/12/2016
57	F.5. Informe 2016	INFORME_2016_CUENCA_.pdf	05/01/2017
58	F.6 Transferencia 2017	2.1._Transferencia_SECOB2017.pdf	18/04/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	F.7. Hito 64. Liquidación contratos 079-DJ-2008 y 038-DJ-2008 (F)	C4.pdf	06/06/2017
60	F.8. Hito 65. Liquidación contratos 076-DJ-2008	C5.pdf	05/07/2017
61	F.9. Hito 61. Liquidación contrato 066-DJ-2008	C2.pdf	05/07/2017
62	G.1. Hito 63. Liquidación contratos 063-DJ-2008 y 108-DJ-2008	C3.pdf	05/07/2017
63	Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de septiembre del año 2018	F-03.pdf	08/10/2018
64	Gestión AGOSTO . Seguimiento a liquidación de contratos	C9.pdf	05/09/2017
65	Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Julio 2017	C7.pdf	08/08/2017
66	Hito 65. Liquidación de un contrato de obra 112-DJ-2008	C6.pdf	08/08/2017
67	Hito 66. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de septiembre de 2017	D1.pdf	04/10/2017
68	Hito 67. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Diciembre de 2017	D4.pdf	05/01/2018
69	Hito 67. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Noviembre de 2017	D3.pdf	05/12/2017
70	Hito 67. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de septiembre de 2017	D2.pdf	01/11/2017
71	Hito 68 y 69. Gestión para liquidar contratos de obra por los meses de Enero y Febrero del año 2018	D6.pdf	18/04/2018
72	Hito 70. Documentación de Respaldo para la reprogramación de Hitos y POA periodo 2018	D7.pdf	18/04/2018
73	Hito 70. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Marzo de 2018	D8.pdf	18/04/2018
74	Hito 71. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de abril del año 2018	D9.pdf	04/05/2018
75	Hito 72. Gestión para liquidar contratos de Obra, Fiscalización y Consultoría por el mes de Mayo del año 2018	E-02_.pdf	05/06/2018
76	Hito 72. Reporte de Liquidación de contratos por el mes de mayo del año 2018	E-01.pdf	05/06/2018
77	Hito 73. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Junio del año 2018	E-06.pdf	13/07/2018
78	Hito 74. Gestión para liquidar contratos de obra por los meses de Julio del año 2018	E-09.pdf	06/08/2018
79	Hito 75. Gestión para liquidar contratos de obra por los meses de Agosto del año 2018	F-01.pdf	05/09/2018
80	Hito 75: Informes de Liquidación entregados por el mes de Agosto del periodo 2018	F-02.pdf	05/09/2018
81	Hito 77. Gestión para liquidar contratos de obra por los meses de Octubre del año 2018	F-05.pdf	05/11/2018
82	Hito 77: Informes de Liquidación entregados por el mes de Octubre del periodo 2018	F-06.pdf	05/11/2018
83	Hito 78. Gestión para liquidar contratos de obra por los meses de Octubre del año 2018	F-08.pdf	05/12/2018
84	Hito 79. Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Diciembre del año 2018	G-02.pdf	04/01/2019
85	Hito 87. Entrega de informe justificativo periodo Agosto 2019	H-01.pdf	05/09/2019
86	Hito 88. Entrega de informe justificativo periodo Septiembre 2019	H-02.pdf	07/10/2019
87	Hito 91 Entrega Informe justificativo gestión período octubre a diciembre de 2019	H-06.pdf	03/01/2020

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
88	Hito 92 Entrega Informe justificativo gestión período enero de 2020	H-07.pdf	12/02/2020
89	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo abril 2019	G-06.pdf	27/05/2019
90	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Mayo 2019	G-07.pdf	02/07/2019
91	Hitos 80-81. Gestión para liquidar contratos por los meses de enero-febrero del año 2019	G-04.pdf	14/03/2019
92	Hitos 84, 85. Entrega de informe justificativo periodo Junio 2019	G-08.pdf	06/09/2019
93	Informe Justificativos pagos no devengados	G-01.pdf	06/12/2018
94	Informe consolidado de la gestión realizada en el primer trimestre, reporte marzo 2019	G-05.pdf	08/04/2019
95	INFORME GESTION AÑO 2017	D5.pdf	12/01/2018
96	Informes de Liquidación de contratos por el mes de diciembre del 2018	G-03.pdf	04/01/2019
97	Informes de Liquidación de contratos por el mes de septiembre del 2018	F-04.pdf	08/10/2018
98	Informes de Liquidación entregados por el mes de Noviembre del periodo 2018	F-09.pdf	05/12/2018
99	Liquidación de un contrato de obra 101-DJ-2008 Agosto 2017	C8.pdf	05/09/2017
100	Proceso de pago del contrato 062-DJ-2008	E-03.pdf	05/06/2018
101	Proceso de pago del contrato 109-DJ-2008	E-04.pdf	05/06/2018
102	Reprogramación del POA realizada en el mes de mayo de 2018	E-05.pdf	18/06/2018
103	Reprogramación del POA realizada en el mes de Octubre de 2018	F-07.pdf	05/11/2018
104	Resumen final 2019	Resumen_final_2019_Carpuela.pdf	06/01/2020
105	Solicitud de reprogramación del POA	E-07.pdf	04/07/2018

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Patrocinador	Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva	pgutierrez@deporte.gob.ec	3969200
Torres Santander, Marcos Eduardo	Líder de proyecto	Director de Infraestructura Deportiva	mtorres@deporte.gob.ec	023969200
